

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 07/03/2022

Inspecteur: Pieter Haspeslagh

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: metrel
ET61557

Serienummer: 19210794

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Vierkeerstraat
Huisnummer 56
Busnummer
Postcode 8531
Gemeente Harelbeke
Land België

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Vierkeerstraat
Huisnummer 56
Busnummer
Postcode 8531
Gemeente Harelbeke
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type : woning

EAN : 54

Teller Nr.: : 74849236

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 1

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V
Aantal kringen: 26

Meter / bord verbinding: 10 mm²
Ri algemeen: 0,507 MΩ

Max beveiliging: 20 A

OK



Aardelektrode: Aardingslus

RE: 1,18 Ω

OK

**DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING**

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I-t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40	-	-	-	26	OK	OK
30	40	-	-	-	7	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
1	C	25		4	4
20	C	20		2	2,5
3	C	16		-	1,5
1	C	16		-	2,5
1	C	6		-	2,5

Visueel nazicht (algemeen) NOK

Directe aanraking OK

Indirecte aanraking OK

Aansluitingen OK

schema in bijlage door Aceg vzw NA

Equipotentiale verbindingen OK

Doorsnede geleiders OK

Continuïteit OK

Verlichting / toestellen NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

I1.01 Eéndraadschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)

I1.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)

I5.02.01 Elke elementaire stroombaan moet met een hoofdletter aangeduid worden. Elk lichtpunt, contactdoos, moeten genummerd worden in volgorde gezien vanaf de beschermingsinrichting tegen overstroom. (Boek 1 onderafdeling 3.1.2.1.)

I5.13 De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (Boek 1 Onderafdeling 3.1.3.3.)

I8.13 Kabels van het type VTLmb, LMVVR, COAX, VVT zijn verboden en dienen vervangen te worden door een type conform Boek 1 Onderafdeling 5.2.1.2.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

nota/note 3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:

- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd

- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Pieter Haspeslagh

De werknemer,



Pieter Haspeslagh
ACEG VZW - #167

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaanisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die niet conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.

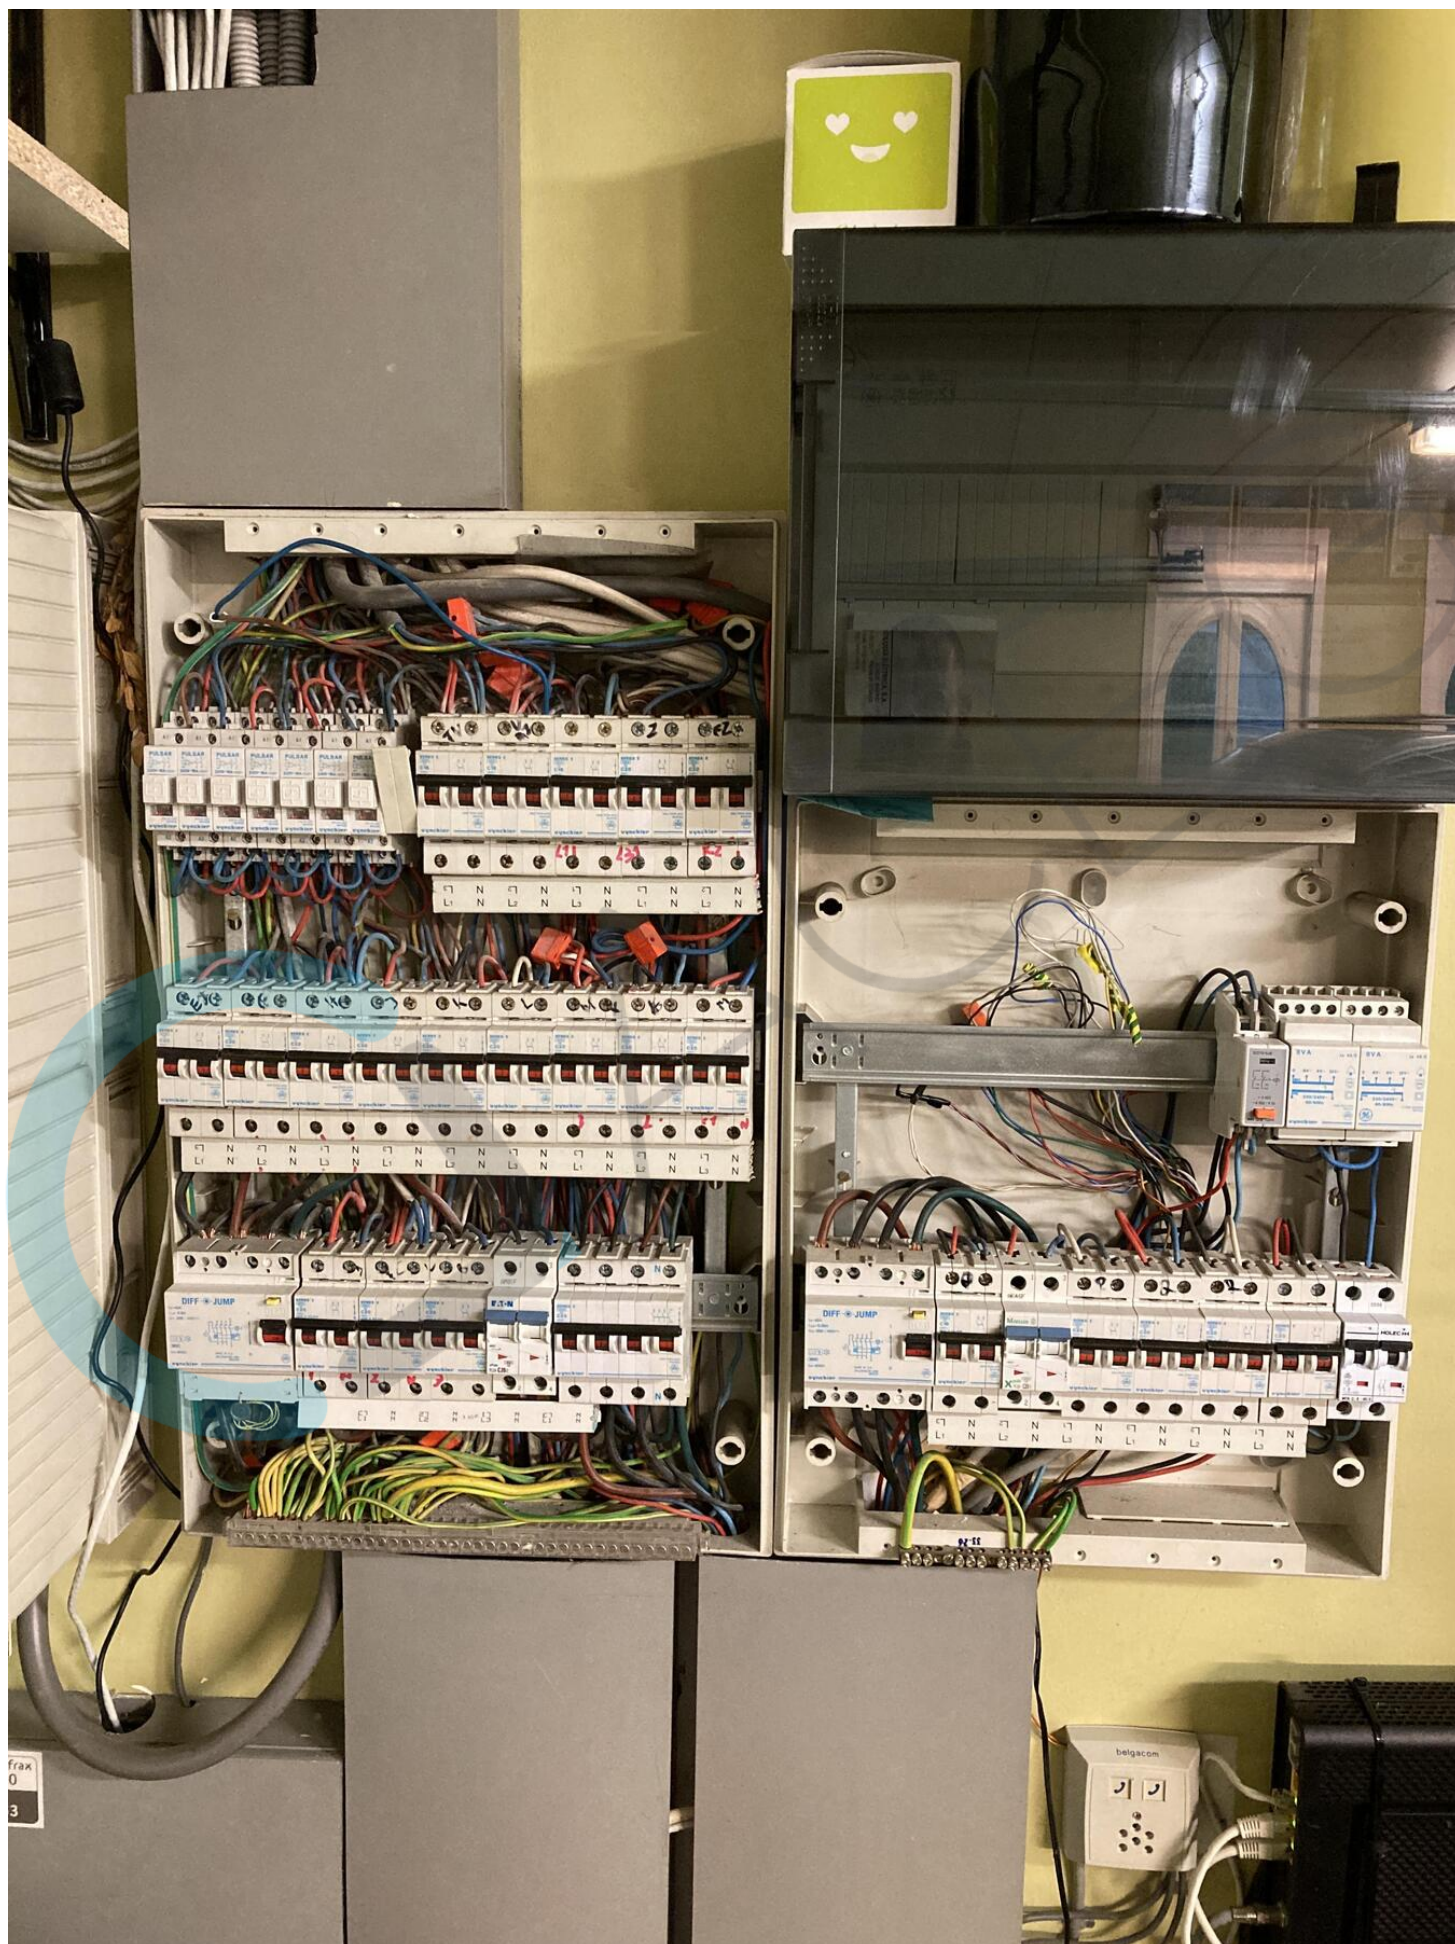

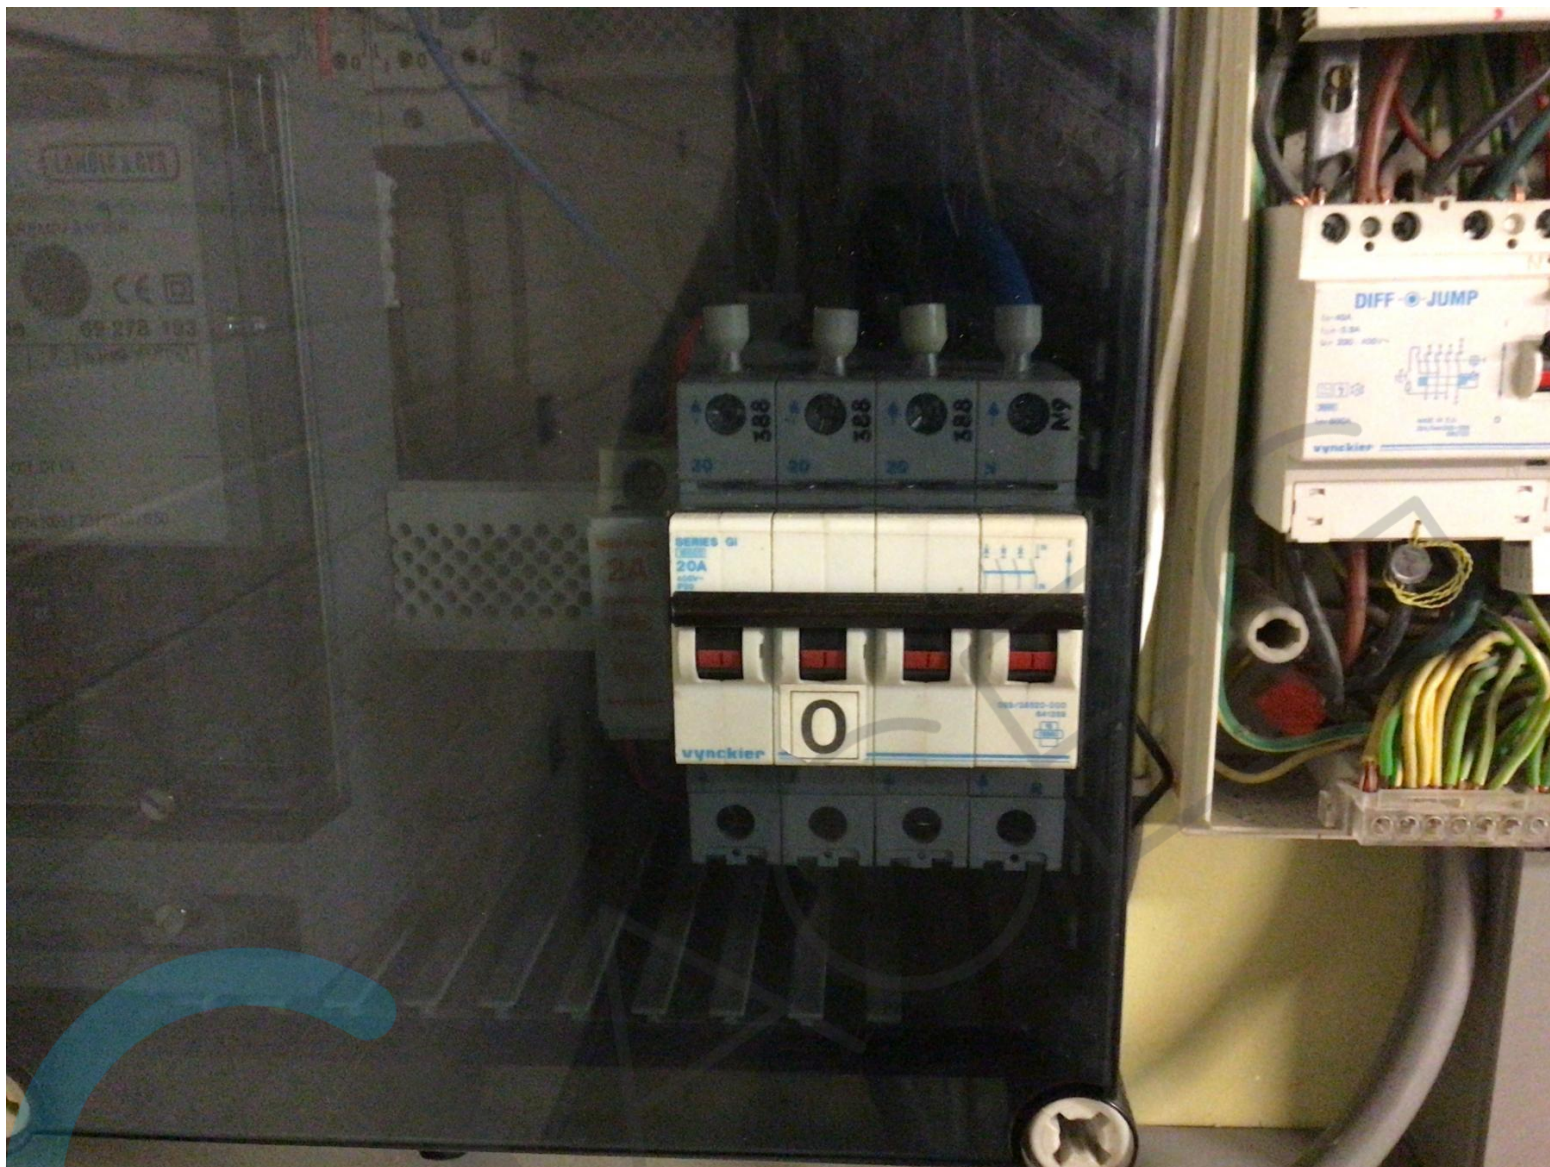

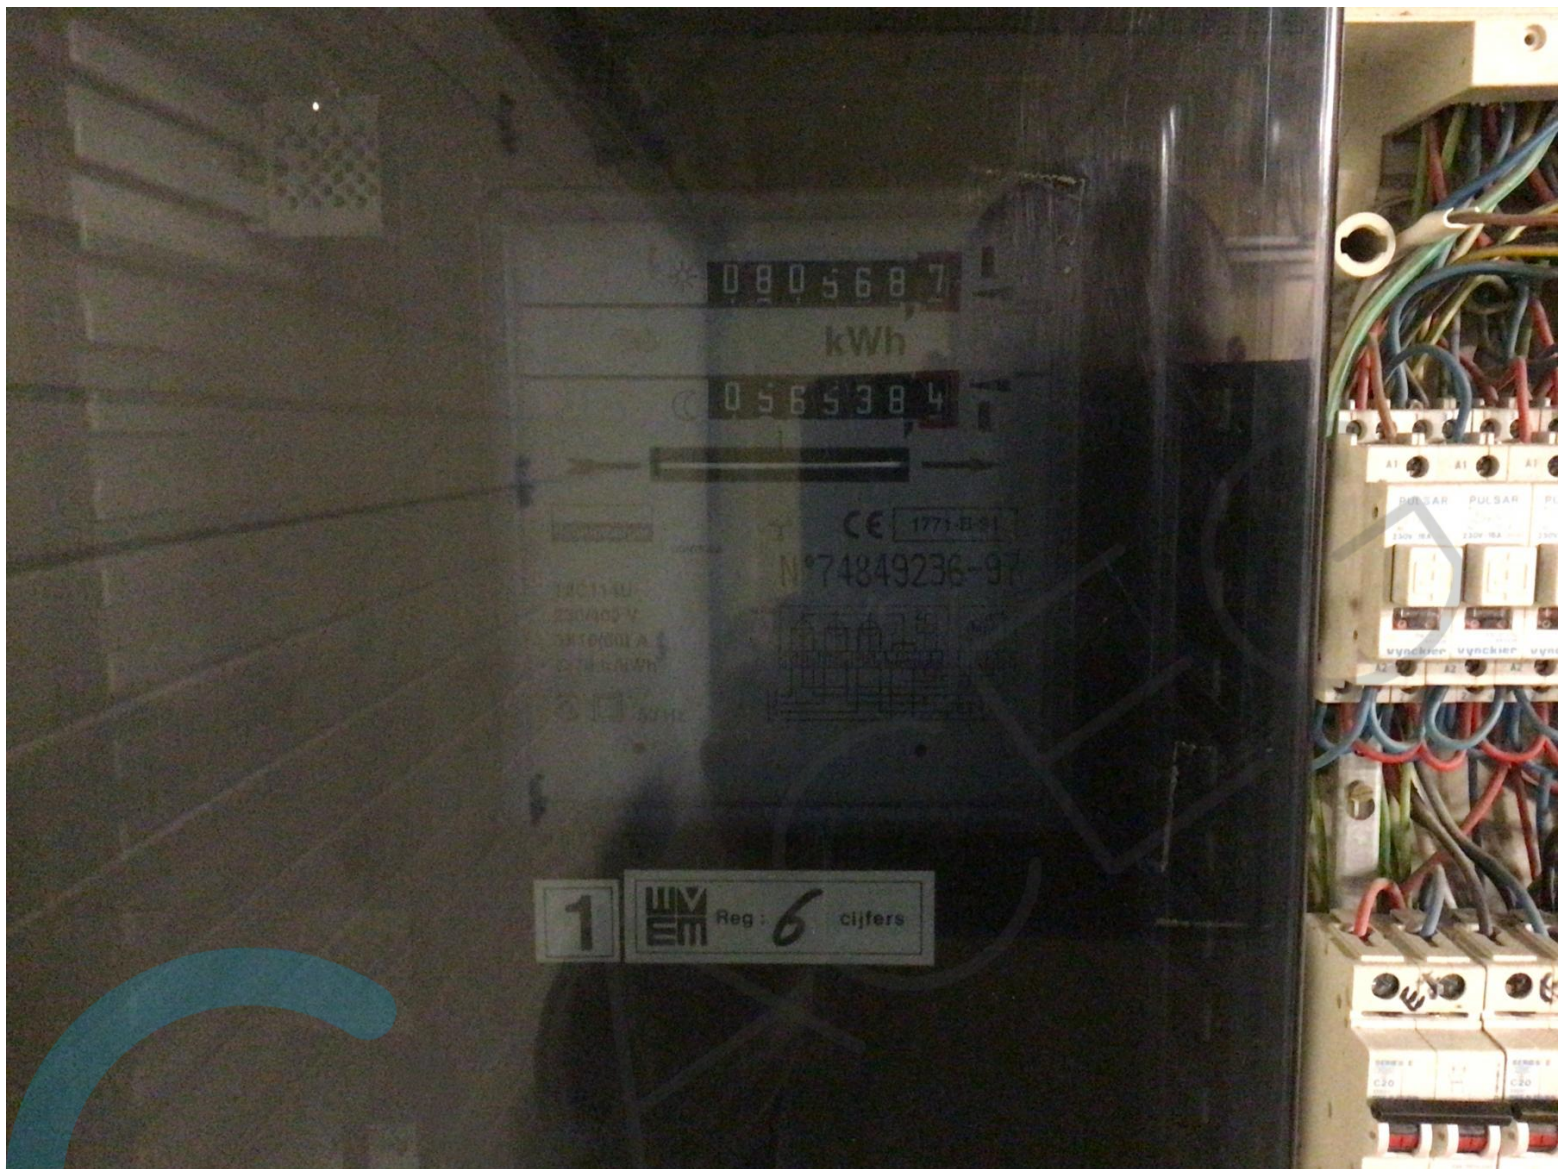


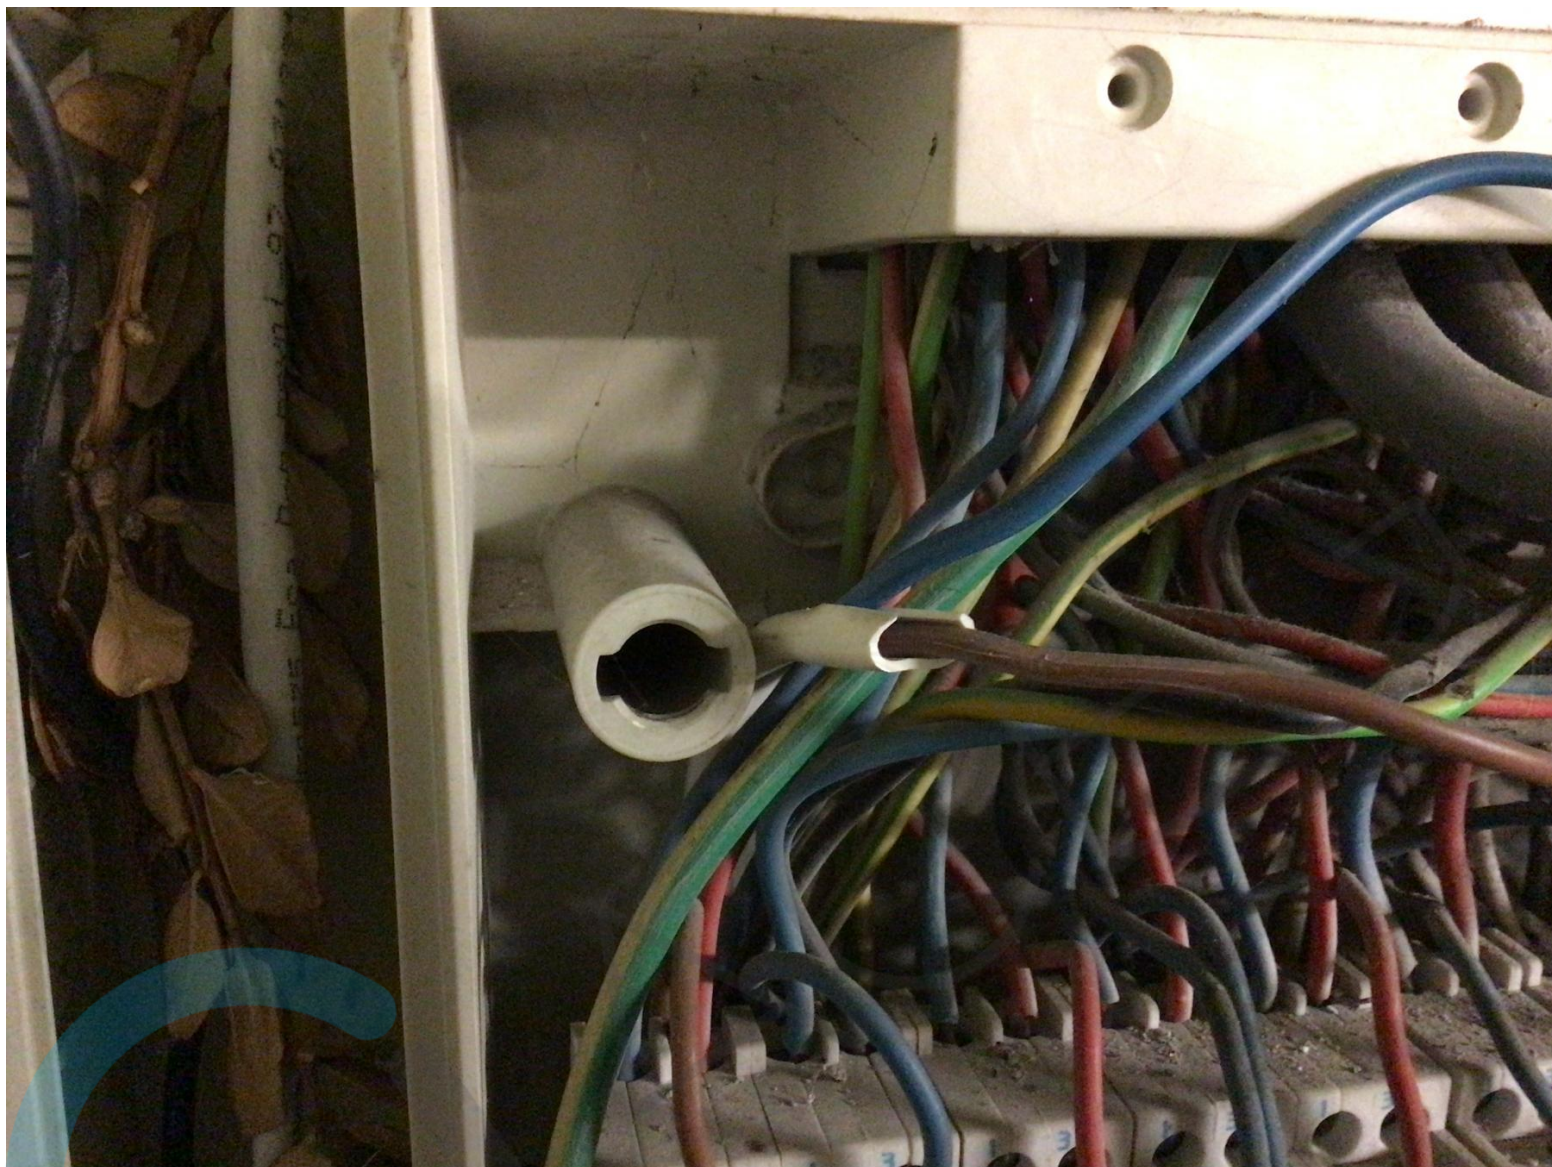







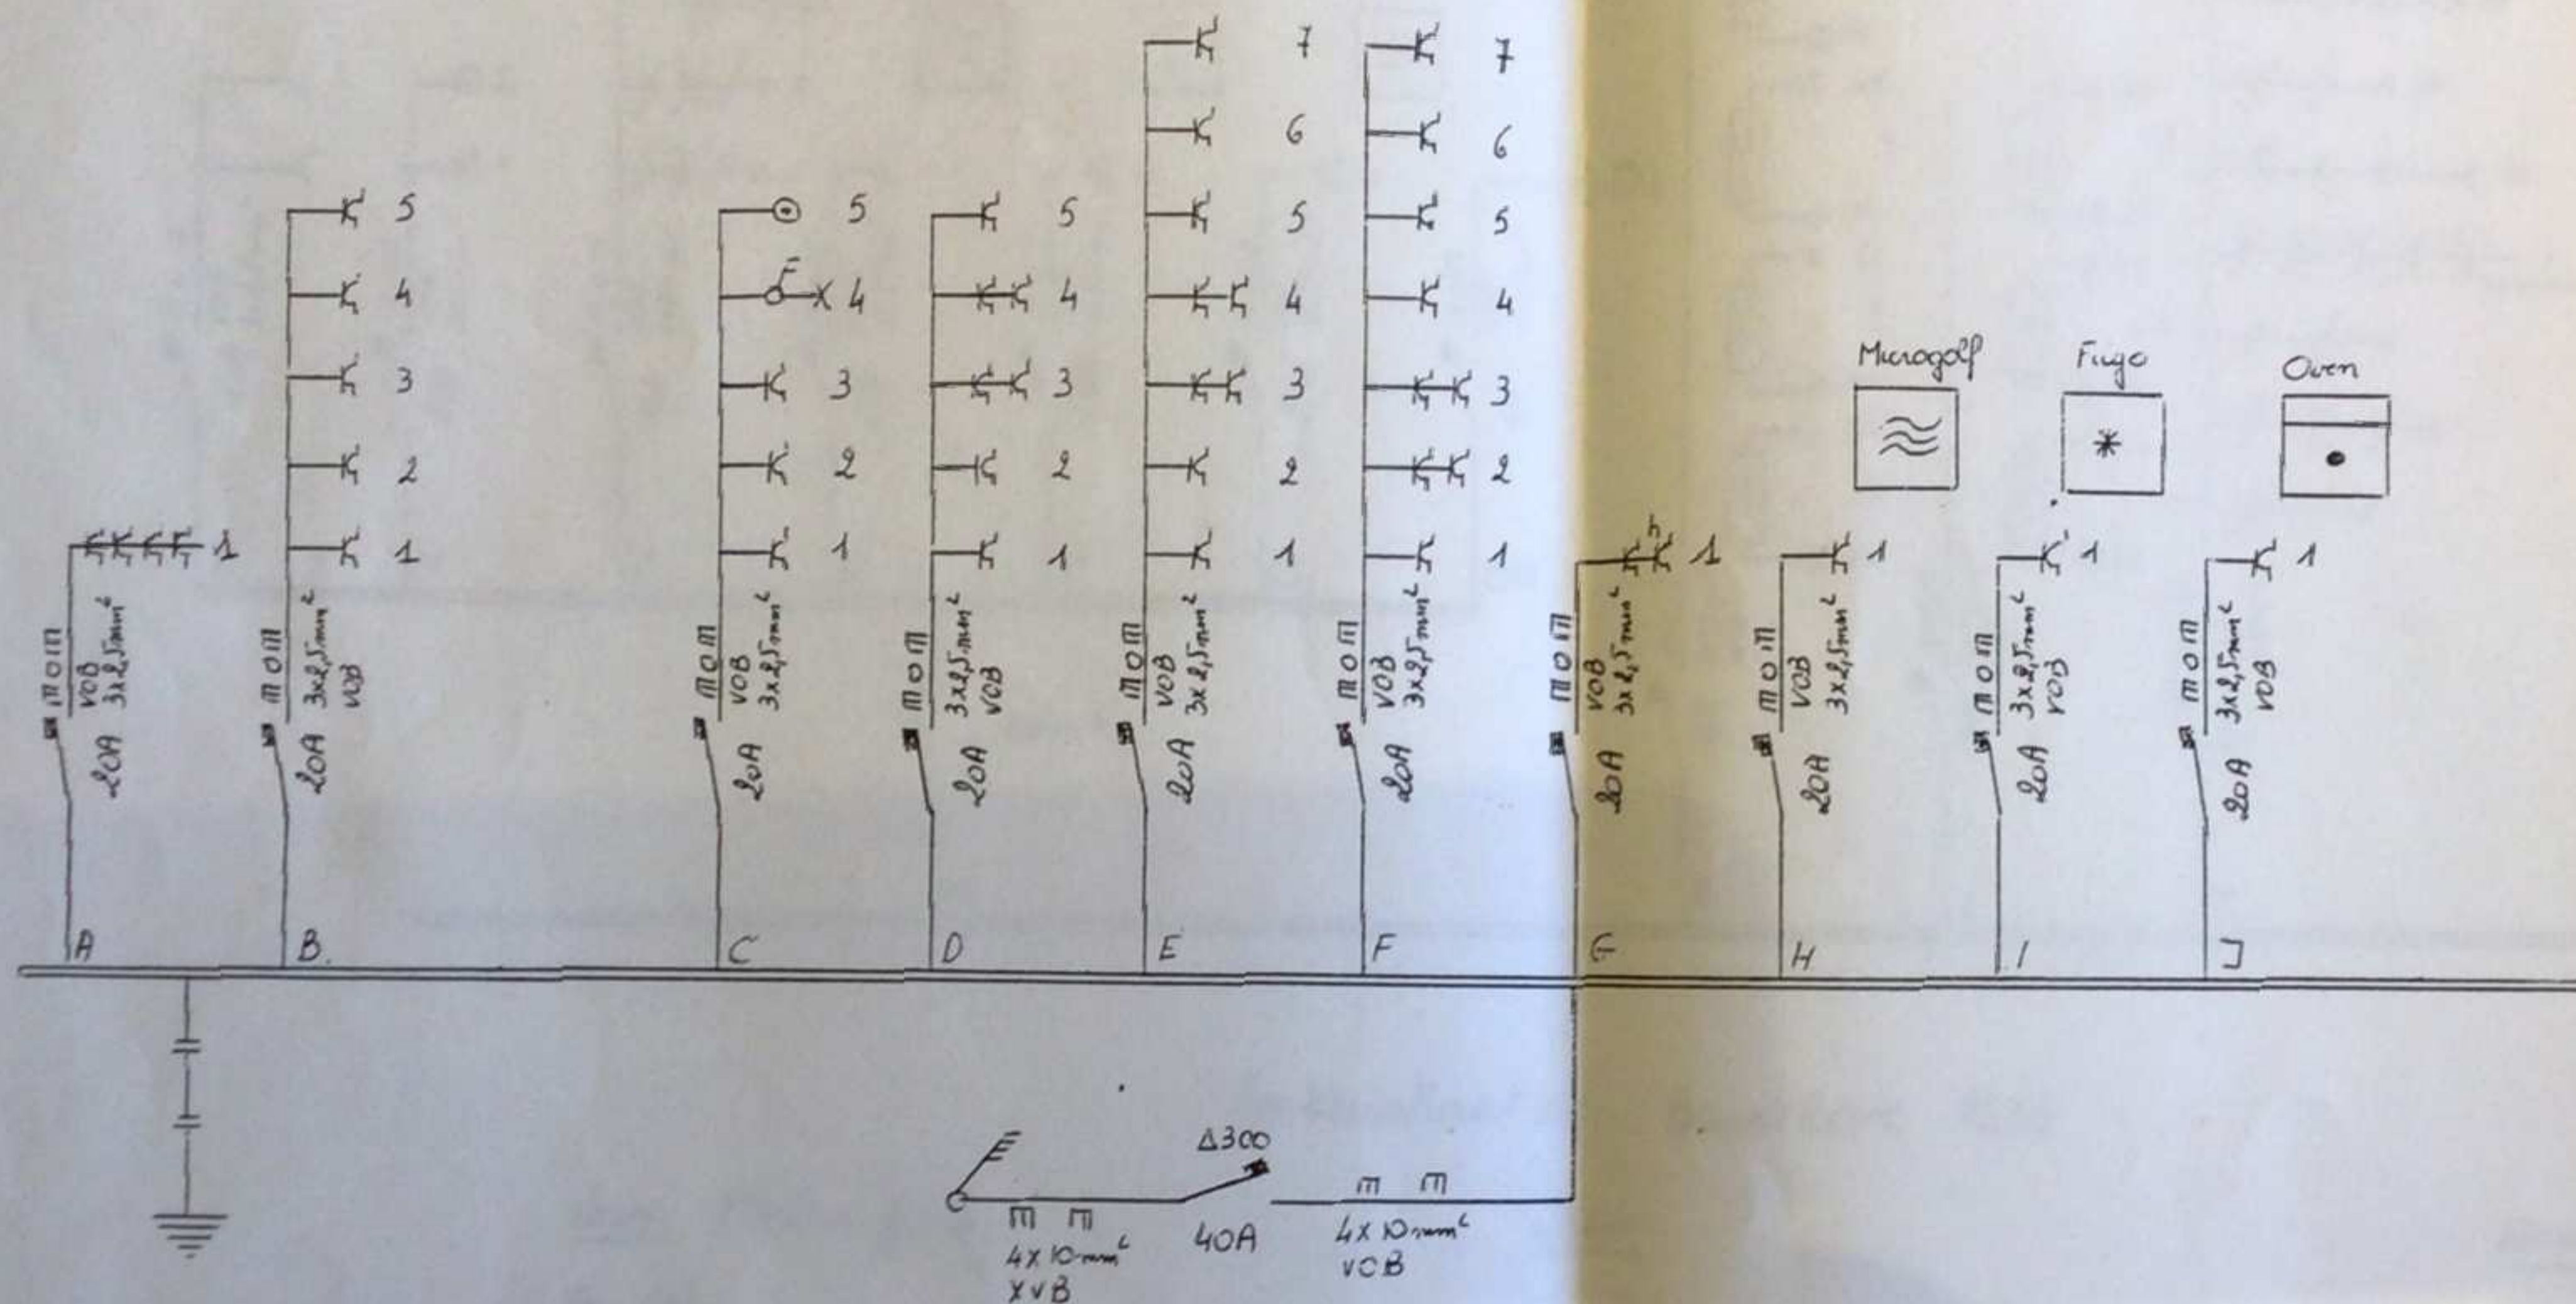

Vierkestraat 52 8531 Bankhoe

Naam: Jacky Mulier

Handtekt:

Datum:

Aantal bladen:

Naam:

Handtekt:

Datum:

AU

311


Naam: Mulier Jacky

Adres: Leiestraat 55

8520 Kuurne

Handtekt:

Datum:

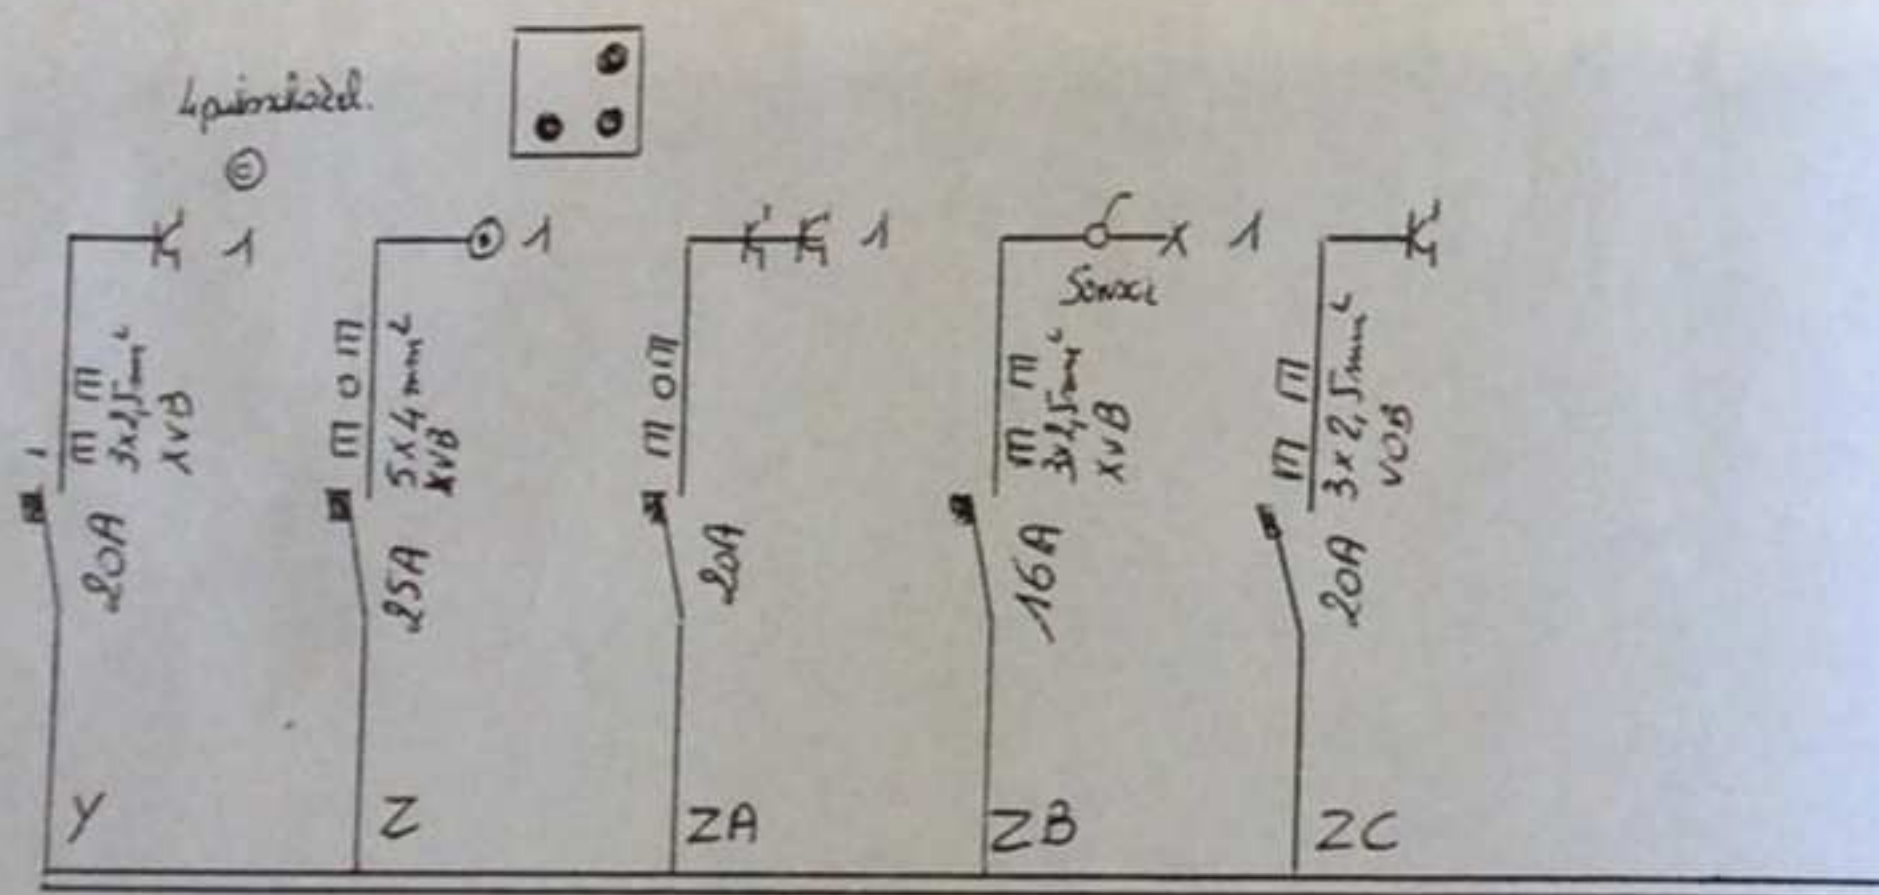

Vierbeeststraat 52 8531 Bennekom

Naam: Mulier Jacky

Handtek:

Datum:

Cloutal bylagen: 4

Naam:

Handtek:

Datum:

 AL
3.11

Naam: Mulier Jacky

Adres: Leiestraat 55

8510 Kuurne

Handtek:


Datum:

Werf Mulier Jacky
 Vierkeerstraat 52
 8531 BAVIKHOVE

LEGENDE ZEKERINGENKAST

A	Stopcontacten stereoketen en tv living	20A
B	Stopcontacten afgemeen living	20A
C	Stopcontacten keuken algemeen	20A
D	Stopcontacten slaapkamer 1	20A
E	Stopcontacten slaapkamer 2, berging en nachthall	20A
F	Stopcontacten hall en garage	20A
G	Stopcontact buiten	20A
H	Stopcontact microgolf	20A
I	Stopcontact frigo	20A
J	Stopcontact oven	20A
K	Differentieel 30 mA 40A	40A
L	Stopcontacten werkblad keuken	20A
M	Stopcontacten badkamer	20A
N	Verlichting badkamer en nachthall	16A
O	Stopcontact vaatwas	20A
P	Stopcontact droogkast	20A
Q	Stopcontact wasmachine	20A
QA	Deurbel	6A
R	Verlichting keuken hall en wc	16A
S	Verlichting garage-voordeur, terras en terras opzij	16A
T	Verlichting living garage berging slaapkamers	16A
U	Rolluiken	20A
V	Chauffage algemeen	20A
W	Pompen + brander	20A
X	Stortpomp	20A
Y	Electrische poort	20A
Z	Electrisch fornuis	25A
ZA	Zonnebank	20A
ZB	Verlichting sensor	16A
ZC	Stopcontact dampkap	20A

178

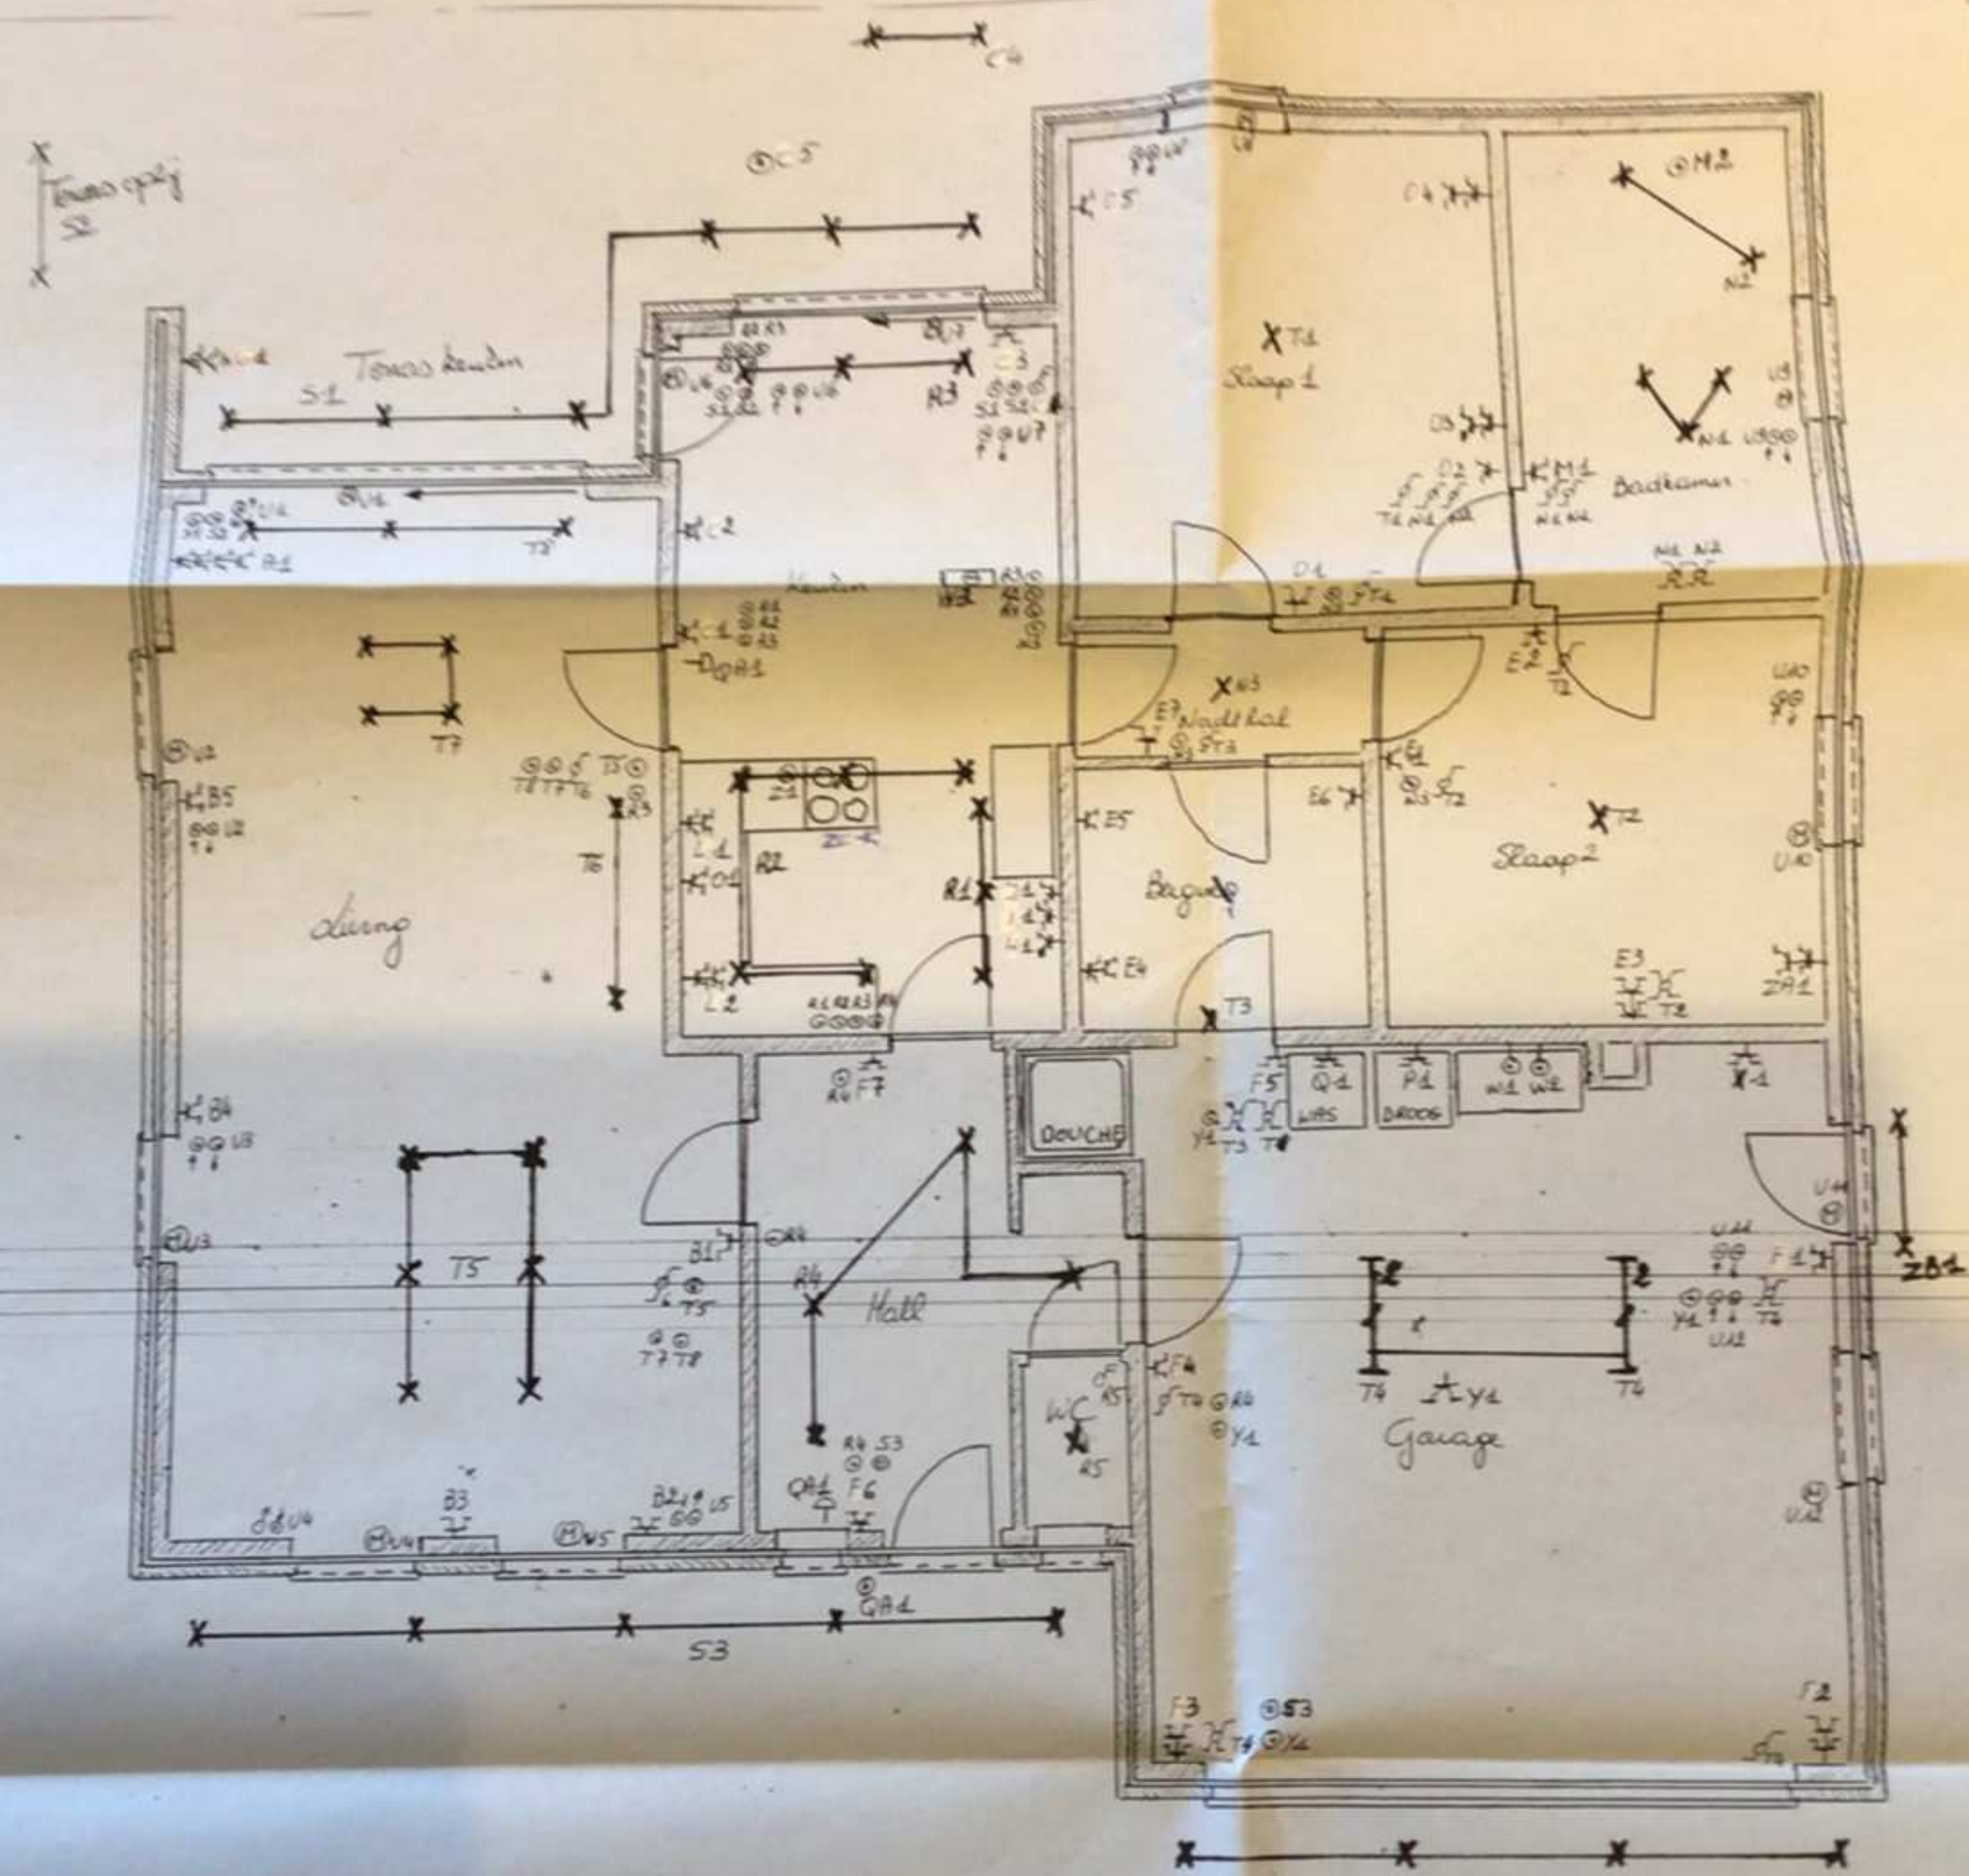

De Installateur

Mulier Jocky
Van der Maat 52
Boulevard
Datum: _____
Handtekt: _____

Voor de Evidente
Kaskele Instelling

Naam: _____
Handtekt: _____
Datum: _____

De Eigenaar

Mulier Jocky
Van der Maat 52
Boulevard
Handtekt: _____
Datum: _____
